

SPRAWOZDANIE

dot. wykonywania zadań w infrastrukturze drogowej dróg powiatowych na terenie Powiatu Limanowskiego w roku 2021 .

Stan na 31 grudnia 2021 r

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH / RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG /

Dzięki uzyskanym przez Powiat Limanowski w roku 2019 dofinansowaniu ze środków budżetu państwa programu pomocowego **Funduszu Dróg Samorządowych** Powiat Limanowski w roku 2021 realizował dwa następujące zadania drogowe;

Zadanie nr 1. (zakończone , realizacja 2020/2021)

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1579K Siekierzyna-Naszacowice w km od 2+468,68 do km 4+638 w miejscowości Przyszowa – Powiat Limanowski”

(od mostu oś. Berdychów do istniejącego chodnika w m. Przyszowa) na odcinku **2,2 km**

(obejmująca jezdnię szer. 6,0 mb , chodnik 2,0mb , odwodnienie i oznakowanie).

Realizacja w partnerstwie z Gminą Łukowica

Wartość zadania : **4.363.616,87 zł** w tym: wykonawstwo 4.346.642,87 zł (*koszty kwalifikowane: 4.335.963,99 zł*)

Finasowanie:

- FDS - 2.167.981,00 zł [50% kosztów kwalifikowanych]
- Powiat: - 1.679.454,87 zł
- Gmina Łukowica - 516.181,00 zł

Finansowanie i wykonanie 2020/2021

Zadanie realizowane przy udziale środków FDS 2020/2021 na podstawie zawartej umowy WR VI.807.4.19..2020 WL

W roku **2021** wydatki inwestycyjne wyniosły : 3.852.755,00 zł , w tym środki:

- FDS - 1.657.119,00 zł,
- Powiatu Limanowskiego - 1.679.455,00 zł
- Gminy Łukowica - 516.181,00 zł.

Zadanie zakończono w wrześniu 2021 r.

Wykonawca: Konsorcjum : Lider Firma „PROFEXIM” Sp. J. H.J.Duda - Oddział w Łostówce wraz z Firmą „PRODİM” Oskar Niezabitowski z Krakowa



Zadanie 2 (kontynuacja, realizacja 2020/2022)

„Przebudowy drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna – Podłopień: odcinek I w km od 0+075 do km 2+678 w miejscowości Łostówka ; odcinek II w km od 5+085 do km 9+120 w miejscowości Łostówka i Wilczyce – Powiat Limanowski”

o łącznej długości **6,6 km** [długość na terenie m. Łostówka - 3,7 km, na terenie m. Wilczyce – 2,9 km] ; wykonanie chodnika szer. 2,0 mb , wykonanie nowej nawierzchni jezdni z poszerzeniem do 6,0mb, wzmocnieniem, oświetleniem ulicznych teren Łostówki , odwodnienie , oznakowanie , przejścia dla pieszych. Realizacja w partnerstwie z Gminą Mszana Dolna i Dobra.

Wartość zadania :**14.293.050,00 zł** w tym: wykonawstwo 14.250.000,00 zł

Finansowanie:

- FDS: 7.089.963,00 zł [50% kosztów kwalifikowanych]
- Powiat: 5.640.333,00 zł
- Gmina Mszana Dolna i Dobra 1.562.754,00 zł [gm. Mszana Dolna – 1.152.424,00zł. , gm. Dobra – 410.330,00zł.]

Finansowanie i wykonawstwo lata 2020-2022, zakończenie wrzesień 2022 r.

W roku 2021 finansowanie inwestycji wyniosło :

wydatek ogółem 7.889.403,00 zł, w tym:

- budżet państwa (FDS) - 2.629.801,00 zł,
- środki powiatu - 4.334.602,00 zł.,
- środki Gminy Mszana Dolna - 600.000,00 zł.,
- środki Gminy Dobra - 325.000,00 zł.

Zadanie realizowane przy udziale środków FDS 2020/2022 na podstawie zawartej umowy WR VI.807.4.14.2020 WL

Wykonawcą zadania jest W.P.P.U.H. „JANDA” z Łostówki.



W ramach jesiennej edycji naboru wniosków 2020r. i uzyskaniu przez Powiat Limanowski 55% dofinansowaniu z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** (*byłe FDS*) zostały rozpoczęte w II połowie 2021r. trzy kolejne zadania drogowe,

Zadanie nr 1. (*realizacja w systemie trzyletnim 2021/2023*)

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 K Łososina Dolna –Ujanowice – Młynne na odcinku I w km 5+831 do km 12+000, na odcinku II w km od 12+000 do km 15+902 w miejscowości Kobylczyna, Ujanowice, Strzeszyce, Krosna, Kamionka Mała, Laskowa, Powiat Limanowski”- przebudowa na odcinku 10,071 km.

Zakres zadania obejmuje dostosowanie drogi do ruchu ciężkiego poprzez wykonanie: odcinkowej pełnej wymiany konstrukcji jezdni z użyciem środka hydrofobowego, wzmocnienie konstrukcji drogi siatką stalową, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, wzmocnienie pobocza drogi wraz z częściowym utwardzeniem bitumicznie, odcinkowe wykonanie chodników w m. Strzeszyce, Kamionka Mała i Laskowa, wykonanie ścieżki rowerowo-pieszej pomiędzy mostami w Laskowej, zatok autobusowych , oświetlenia ulicznego wzdłuż realizowanych chodników , ścieżki oraz zatok autobusowych. Zadanie w partnerstwie z Gminą Laskowa.

Wartość całkowita zadania kształtuje się w wysokości : ogółem ok. **22.140.014,73 zł** (w tym roboty budowlane 21.941.234,73 zł, nadzór inwestycyjny 48.780,00 zł oraz koszty badań niezależnego laboratorium ok. 150.000,00 zł.)

Założenia finansowania wydatków w latach: rok 2021 - 1.892 tys. zł, rok 2022 -11.241 tys. zł , rok 2023 -9.006 tys. zł. w tym:

RFRD - 11.513.763,00 zł.

Powiat Limanowski - 9.996.598,00 zł.

Gmina Laskowa - 629.654,00 zł. (50% kosztów własnych chodniki , 100% kosztów własnych oświetlenie uliczne)

Poniesiony wydatek finansowy w roku **2021** wyniósł - 923.314,00 zł. (w tym środki RFRD – 923.314,00 zł.)

Wykonawca zadania : Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LIMDROG Sp. z o.o. z Limanowej.





Zadanie nr 2. (realizacja w systemie dwuletnim 2021/2022)

„ Remont drogi powiatowej nr 1618 K Limanowa – Szyk - Mstów na odcinku I w km od 5+800 do km 8+115 , na odcinku II w km od 8+500 do km 11+333 w miejscowości Rupniów, Nowe Rybie, Szyk, Powiat Limanowski”. Planowana długość odcinka do remontu **5,2 km.**(w tym na terenie Gm. Limanowa - 3,0 km , Gm. Jodłownik – 2,2 km)

Zakres zadania obejmuje : likwidację zapadnięć, przełomów, odcinkowa wymiana konstrukcji jezdni, wzmocnienie pobocza drogi, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, wraz z wzmocnieniem geosiatką, regulacja odwodnienia wzdłuż drogi, remont przepustów drogowych, odcinkowy remont chodnika.

Wartości całkowita zadania: **6.869.900,00 zł.** w tym (wykonawstwo 6. 830.000,00 zł., nadzór inwestorski 19.900,00 zł., promocja 20.000,00 zł.).

Finansowania:

- RFRD - 3.731.594,00 zł [55% kosztów kwalifikowanych]
- Powiatu Limanowski - 3.138.306,00 zł.

Wydatek finansowy poniesiony w roku **2021** wyniósł: 2.093.181,00 zł zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym. (w tym RFRD – 2.058.061,00 zł , Powiat - 35.120,00 zł.)

Wykonawca zadania : W.P.P.U.H. „JANDA” z Łostówki





Zadanie nr 3. (realizacja w systemie dwuletnim 2021/2022)

„ Remont drogi powiatowej nr 1616 K Mszana Górna – Podłopień na odcinku I w km od 9+120 do km 10+525 , na odcinku II w km od 10+565 do km 10+710, na odcinku III w km od 10+776 do km 15+472 w miejscowości Wilczyce, Jurków i Dobra, Powiat Limanowski”.

Długość remontowanego odcinka- **6,5 km.** kontynuacja przebudowywanej obecnie drogi w m. Łostówka/Wilczyce (rejon od skrzyżowania z drogą w kierunku Łętowe do centrum Dobrej.) Zakres robót obejmuje: likwidację przelomów i zapadnięć, odcinkową wymianę konstrukcji jezdni, wzmocnienie nawierzchni geosiatką, wzmocnienie pobocza drogi, regulację odwodnienia, remont przepustów drogowych, miejscowy remont nawierzchni istniejącego chodnika, położenie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z częściowym utwardzeniem bitumicznie pobocza oraz oznakowanie drogowe. (obszar istniejącego osuwiska wyłączony z realizacji zadania – odrębne zadanie w ramach tzw. osłony przeciwosuwiskowej).
Zadanie realizowane w systemie 12 m-cy od podpisania umowy, zakończenie czerwiec 2022.

Wartość całkowita zadania: **6.930.000,00 zł.** (w tym wykonawstwo 6.833.333,33 zł. , nadzór inwestorski i promocja 96.667,00 zł.)

Finansowanie zadania :

- budżet państwa RFRD - 3.697.020,00 zł. [55% kosztów kwalifikowanych]
- Powiat Limanowski - 3.232.980,00 zł.

Wydatki finansowe poniesione w roku **2021** na podstawie harmonogramu, kwota - 2.531.192,00 zł (w tym środki RFRD -2.374.266,00 zł. , środki Powiatu - 156.926,00zł.)

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LIMDROG Sp. z o.o. z Limanowej.





Na koniec sierpnia 2021 Powiat Limanowski złożył wnioski aplikacyjne o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2022/2023 (w systemie 12-m-cy) na kolejne trzy zadania :

1. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 Mszana Górna-Wilczyce w km od 2+850 do km 5+610 w miejscowości Łętowe - Powiat Limanowski”**
Szacunkowa wartości **12.048.152,00 zł** przy udziale środków RFRD 6.014.075,00 zł, Powiatu 4.398.909,00 zł, oraz JST (*Gm. Mszana Dolna*) 1.635.168,00 zł.
2. **„Remont drogi powiatowej nr 1629K Mszana Dolna -Hucisko na odcinku I w km od 0+050 do km 5+254, w miejscowości Mszana Dolna, Podobin i Niedźwiedź - Powiat Limanowski”.**
Szacunkowa wartości **4.889.169,00 zł** planowane do realizacji w 2022 i 2023 r. przy udziale środków RFRD 2.424.217,00 zł, powiatu 1.805.303,00 zł oraz JST (*M. Mszana Dolna i G. Niedźwiedź*) 659.649,00 zł
3. **„Remont drogi powiatowej nr 1614K Słopnice- Chyszówki -Jurków w km od 0+000 do km 10+595 w miejscowości Słopnice, Chyszówki , Jurków - Powiat Limanowski”.**
Szacunkowa wartości **23.405.469,00 zł** udziale środków RFRD 11.143.177,00 zł, Powiatu 8.752.642,00 zł oraz JST (*Gmina Słopnice i Dobra*) 3.509.650,00 zł.

Zadania pozytywnie ocenione - zakwalifikowane przez Komisję Wojewody Małopolskiego , Lista zadań oczekuje akceptacji Premiera (zgodnie z zasadami RFRD)

PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

„Poprawa warunków bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych”

W ramach **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** (*edycji wiosennej 2021*) - Powiat Limanowski uzyskał 80% dofinansowanie ze środków budżetu państwa na wykonanie w roku 2021 w ramach zadania „**Poprawa warunków bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych**” dla trzech aplikowanych zadań powiatowych obejmujących budowę 2-ch nowych przejścia dla pieszych i przebudowę 1-go istniejącego przejścia dla pieszych wraz z działaniami w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia.

Zadanie nr 1 :

„Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1609K Limanowa-Kamienica w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km od 0+401,55 w miejscowości Limanowa, miasto Limanowa, powiat limanowski” (rejon skrzyżowania ul. J. Marka z ul. Jordana)

Zakres zadania : budowa dedykowanego oświetlenia dwóch przejść z asymetrycznym rozsyłem strumienia, dostosowanie przejść dla osób z dysfunkcjami ruchowymi i wzroku, montaż znaku aktywnego D-6 animowanego montowany nad jezdnią na konstrukcji wsporczej, wykonanie oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego (*malowanie grubowarstwowe*), odtworzenie chodnika,

Wartość całkowita zadania : **138.745,27 zł.** (w tym wykonawstwo : 128.415,00 zł. , PT -8.610,00 zł. / nadzór+promocja 1.720,00 zł.)

Finansowanie:

- RFRD - 98.253,00 zł (80 % kosztów kwalifikowanych),
- Powiatu Limanowski - 40.492,27 zł.

Wydatek poniesiony roku 2021: **60.656,67 zł** (w tym RFRD – 49.126,00 zł., Powiatu – 20.530,67 zł.)

Zakończenie zadania : koniec kwietnia 2022r.

Wykonawca zadania: Zakład Usług Budowlanych Mariusz Siwek, Nowy Sącz



Zadanie nr 2:

„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1610K Świdnik-Limanowa w obszarze oddziaływania w km od 3+684 do 3+709 (w tym przejście dla pieszych w km 3+690,55) w miejscowości Łukowica, gmina Łukowica, powiat limanowski” (centrum m. Łukowica)

Zakres zadania : budowa dedykowanego oświetlenia przejścia z asymetrycznym rozsyłem strumienia, dostosowanie przejścia dla osób z dysfunkcjami ruchowymi i wzroku, przeniesienie znaku D-6, kaseton 900x900 dwustronny montowany nad jezdnią na konstrukcji wsporczej, wykonanie oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego (*malowanie grubowarstwowe*), odtworzenie chodnika,

Wartość całkowita zadania : **120.347,12 zł.** (w tym wykonawstwo : 118.627,12 zł. , nadzór+promocja 1.720,00 zł.)

Finansowanie:

- RFRD - 58.409,00 zł. (51,5 % kosztów kwalifikowanych),
- Powiatu Limanowski - 61.938,12 zł.

Wydatek poniesiony roku 2021: **57.478,25 zł** (w tym RFRD – 57.258,25 zł. , Powiatu – 220,00 zł.)

Zakończenie zadania : koniec kwietnia 2022r.

Wykonawca zadania: Zakład Usług Budowlanych Mariusz Siwek, Nowy Sącz



Zadanie nr 3:

„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1629K Mszana Dolna – Hucisko w obszarze oddziaływania w km od 4+762 do 4+878 (w tym przejście dla pieszych w km 4+820) w miejscowości Niedźwiedź, gmina Niedźwiedź, powiat limanowski” (m. Niedźwiedź rejon oś. Papiernia – chodnik , przejście z oświetleniem dedykowanym)

Zakres zadania: budowa dedykowanego oświetlenia przejścia z asymetrycznym rozsyłem strumienia, dostosowanie przejścia dla osób z dysfunkcjami ruchowymi i wzroku, montaż znaku aktywnego D-6 dwustronny z dwoma pulsatorami zamontowany nad jezdnią na konstrukcji wsporczej, budowa chodnika (12mb) ,budowa kanału technologicznego, przebudowa zjazdu, wykonanie oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego (*malowanie grubowarstwowe*),

Wartość całkowita zadania : **94.155,34 zł.** (w tym wykonawstwo : 92.435,34 zł. , nadzór+promocja 17.200,00 zł.)

Finansowanie:

- RFRD - 71.389,00 zł. (80% kosztów kwalifikowanych),
- Powiatu Limanowski - 22.766,34 zł.

Wydatek poniesiony roku 2021: **45.063,99 zł** (w tym RFRD – 44.843,99 zł. ,Powiatu – 220,00 zł.)

Zakończenie zadania : koniec kwietnia 2022r.

Wykonawca zadania: Zakład Usług Budowlanych Mariusz Siwek, Nowy Sącz



W ramach jesiennej edycji 2021 - Powiat Limanowski otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na kolejne wykonanie trzech przejść dla pieszych:

Zadanie 1 :

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1610K Świdnik – Limanowa w obszarze oddziaływania w km od 10+408 do 10+608 (w tym przejście dla pieszych w km 10+508) w miejscowości Siekierzyna, gmina Limanowa, powiat limanowski” (przejście w rejonie szkoły w m. Siekierzyna)

Zakres zadania : budowa dedykowanego oświetlenia przejścia z asymetrycznym rozsyłem strumienia, dostosowanie przejścia dla osób z dysfunkcjami ruchowymi i wzroku, montaż znaku D-6, kaseton 900x900 dwustronny montowany nad jezdnią na konstrukcji wsporczej, wykonanie oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego (*malowanie grubowarstwowe*), pasy akustyczne

Wartość całkowita zadania : **117.385,00 zł.** (w tym wykonawstwo : 108.900,00 zł. ,PT- 6.765,00zł. , nadzór+promocja 1.720,00 zł.)

Finansowanie :

- RFRD - 86.824,00 zł. [80 % kosztów kwalifikowanych]
- Powiat - 30.561,00 zł.

Poniesiony wydatek w roku **2021** : 6.765,00 zł. – środki Powiatu

Planowane zakończenie do końca czerwca 2022r.

Zadanie 2 :

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1551K Limanowa - Chelmiec w obszarze oddziaływania w km od 6+689 do 6+889 (w tym przejście dla pieszych w km 6+789) w miejscowości Piszczowa, gmina Limanowa, powiat limanowski” (przejście w rejonie kościoła w m. Piszczowa)

Zakres zadania : budowa dedykowanego oświetlenia przejścia z asymetrycznym rozsyłem strumienia, dostosowanie przejścia dla osób z dysfunkcjami ruchowymi i wzroku, montaż znaku D-6, kaseton 900x900 dwustronny montowany nad jezdnią na konstrukcji wsporczej, wykonanie oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego (*malowanie grubowarstwowe*), pasy akustyczne

Wartość całkowita zadania : **112.150,00 zł.** (w tym wykonawstwo : 109.200,00zł. ,PT- 1.230,00 zł. , nadzór+promocja 1.720,00zł.)

Finansowanie :

- RFRD - 86.868,00 zł. [80 % kosztów kwalifikowanych]
- Powiat - 25.282,00 zł.

Poniesiony wydatek w roku **2021** : 1.230,00 zł. – środki Powiatu

Planowane zakończenie do końca czerwca 2022r.

Zadanie 3 :

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa - Chelmiec w obszarze oddziaływania w km od 10+419 do 10+619 (w tym przejście dla pieszych w km 10+519) w miejscowości Męcina, gmina Limanowa, powiat limanowski” (przejście w rejonie kościoła w m. Męcina)

Zakres zadania: budowa dedykowanego oświetlenia przejścia z asymetrycznym rozsyłem strumienia, dostosowanie przejścia dla osób z dysfunkcjami ruchowymi i wzroku, montaż znaku D-6, kaseton 900x900 dwustronny montowany nad jezdnią na konstrukcji wsporczej, wykonanie oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego (*malowanie grubowarstwowe*), pasy akustyczne

Wartość całkowita zadania : **124.585,00 zł.** (w tym wykonawstwo : 116.100,00zł. , PT- 6.765,00 zł. , nadzór+promocja 1.720,00zł.)

Finansowanie :

- RFRD - 92.486,00 zł. [80% kosztów kwalifikowanych]
- Powiat - 32.099,00 zł.

Poniesiony wydatek w roku 2021 : 6.765,00 zł. – środki Powiatu

Planowane zakończenie do końca czerwca 2022r.

Wykonawcą w/w trzech przejść jest Firma Usługi Budowlane „TECHDROG” Klaudia Sułat z Warszawy.

REZERWA SUBWENCJI OGÓLNEJ MINISTRA INFRASTRUKTURY

W ramach pozyskanego przez Powiat Limanowski z programu pomocowego budżetu państwa – rezerwy subwencji ogólnej będącej w dyspozycji Ministerstwa Infrastruktury 50% dofinansowania na zadanie mostowo-drogowe w wysokości **1.428.318,00 zł** zrealizowano następujące zadania:

Zadanie podstawowe :

„Przebudowa i rozbudowa obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1612K Laskowa Nagórze w m. Laskowa wraz z dojazdami”

obejmujące w swym zakresie: gruntowną przebudowę i rozbudowę obiektu mostowego JNI 350000230 w km 0+812 (*drugi most od centrum Laskowej*) o konstrukcji płytowo-żelbetowej o długości 15,5 mb : budowa nowej płyty nośnej mostu z obciążeniem mostu klasa II, wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz chodnika, wzmocnienie przyczółków, stożki mostu. W ramach dojazdów wykonano nową nawierzchnię bitumiczną jezdni szer. 6,0 mb, w km 0+245-0+801 i w km 0+832-0+973 wraz z mostem na łącznej długości 712,5 mb, pobocze utwardzone w połowie bitumiczne, regulacja odwodnienia , kanał technologiczny, odcinkowe zabezpieczenia siatkowo-kamienne korpusu drogi


Wartość całkowita zadania **1.748.383,33 zł** . (w tym wykonawstwo : 1.665.703,33 zł., nadzór inwestorski 14.990,00 zł. , PT 67.690,00 zł.)

Finansowanie:

Rezerwa subwencji ogólnej - 843.191,00 zł.

Powiat Limanowski - 905.192,33 zł.

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Usługowo-Inżynieryjne BUDMOST -Rafał Jędrzejek , Laskowa 803

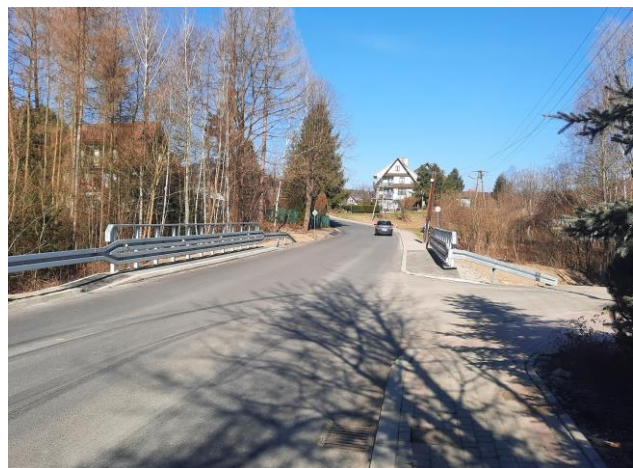

W ramach uzyskanej oszczędności w planie inwestycyjnym PZD na rok 2021 w wysokości wynoszącej **1.177.934,67 zł** w tym środków budżetu państwa – 585.127,00 zł. za zgodą Zarządu Powiatu przy jednoczesnej akceptacji Ministerstwa Infrastruktury wykonano odcinkową przebudowę drogi powiatowej nr 1615K Tenczyn-Glisne-Mszana Dolna w ul. Zarabie (*obejmującego likwidację przełomów, wykonanie*

nowej wzmocnionej nawierzchni bitumicznego wraz z poszerzeniem, odwodnienie i utwardzenie pobocza) w km 8+176 -8+701 (dł. 525 mb) w ramach zadania pn:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1625K Tenczyn -Glisne-Mszana Dolna w km od 8+176 do km 8+701 w miejscowości Mszana Dolna – ul. Zarabie” (dł. 525 mb)

Zakres zadania obejmował: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, przebudowę kolidującej sieci telekomunikacyjnej, likwidację przelomów, przebudowę odwodnienia liniowego drogi, odcinkowa kanalizacja opadowa, poszerzenie i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni geosiatką , wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, oznakowanie drogowe, montaż barier zabezpieczających - ochronnych

Wartość całkowita zadania: **1.531.695,42 zł.** (w tym wykonawstwo: 1. 507.095,42 zł).

Finansowanie zadania :

Rezerwa subwencji ogólnej - 585 127,00 zł.

Powiat Limanowski - 946.568,42 zł.

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe LIMDROG Sp. z o.o., Limanowa



CHODNIKI

Realizacja w ramach inicjatyw samorządowych [IS]

Gmina Dobra (*kontynuacja robót , realizacja 2020/2022*)

„Przebudowy drogi powiatowej nr 1622K Dąbie Szczyrzyc-Dobra w km 15+330,35 do km 16+539,90 w miejscowości Porąbka Dobra” - budowa chodnika na odcinku 1 209,55 mb. w systemie trzyletnim 2020-2022. Zadanie realizowane w partnerstwie z Gminą Dobra w relacji 50/50.

Wartość całkowita zadania : **1.471.507,22,22 zł. brutto** w tym (*wykonawstwo chodnika – 1.381.917,12 zł; dokumentacja projektowa- 59.458,20zł. nadzór inwestorski – 11.150,00 zł. , opłaty PKP – 18 981,90 zł.*) przy czym:

- 1) 50% udział Powiatu Limanowskiego - 742.520,02 zł .brutto
- 2) 50% udział Gminy Dobra - 728.987,20 zł. brutto (w tym udział finansowy – 669.529,00 zł. , rzeczowy PT – 59.458,20 zł.)

Finansowanie w rozbiciu na lata 2021/2022 przedstawia się następująco:

Rok 2021 . wydatki poniesione **733.553,00 zł.**

- Powiat Limanowski - 333 553,00 zł.

- Gmina Dobra - 400.000,00 zł.

Rok 2022 . planowane wydatki (578.516,20 zł.)

- Powiat Limanowski - 308.987,20 zł.

Zakończenie zadania – maj 2022r.

Wykonawca: P.R.I. „DUDA” Grażyna Duda , Łostówka



Gmina Mszana Dolna (zakończone)

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1626K Kasinka Mała - Węglówka-Kasina Wielka w km 1+246 - 4+536,20 w m. Kasinka Mała. Etap II w km 3+233,75 - 4+536,20 poprzez wykonanie chodnika wraz z oświetleniem ulicznym”. Odcinek długości 1302 mb (chodnik i oświetlenie uliczne)

Zadanie wykonane w systemie dwuletnim :2020/2021.

Wartość całkowita zadania: **1.835.515,00 zł** (w tym: wykonawstwo: chodnik: 1.558.886,25 zł; oświetlenie uliczne: 261.113,75 zł oraz nadzór inwestorski: 12.740,00zł + aktualizacja dokumentacji oświetlenia 3 075,00 zł).

Finansowanie :

- Powiat Limanowski – 787.995,00 zł (50% wartości wykonania chodnika, 43% wartości nadzoru inwestorskiego)
- Gmina Mszana Dolna – 1.047.820,00 zł (50% wartości wykonania chodnika, 100% wartości wykonania oświetlenia ulicznego; 57% wartości nadzoru inwestorskiego)

Poniesiony wydatek finansowy wg. planu w roku **2021** wynosił : **535.815,00 zł**,

w tym finansowanie:

- Powiatu Limanowskiego - 187.995,00 zł.,
- Gminy Mszana Dolna - 347.820,00 zł.

Wykonawca zadania : W.P.P.U.H. JANDA z Łostówki.



Gmina Łukowica

Zadanie nr 1. (zakończone)

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1579K Siekierzyna -Naszacowice od km 4+657,62 do km 4+896,32 w miejscowości Przyszowa poprzez wykonanie chodnika i pobocza bitumicznego ” (od przejścia na skrzyżowaniu z drogą gminną na Kaninę do wysokości cmentarza parafialnego)

Wartość całkowita zadania: **110.923,80 zł. brutto** (w tym wykonawstwo 98.131,80 zł. , dokumentacja projektowa – 12.792,00 zł.)

Finansowanie w ramach IS w relacji 50/50: Inwestor G. Łukowica

- Powiat Limanowski – 55.462,00 zł. brutto

- Gminy Łukowica – 55.461,80 zł. brutto

Wykonawca: PROFEXIM Spółkę Jawną H.J. Duda



Zadanie nr 2 (kontynuacja , realizacja 2021/2022)

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1545K Podegrodzie – Mokra Wieś – Jastrzębie w miejscowości Stronie w km 6+994,57 – 7+817,32” (od skrzyżowania z dr. gminną Stronie – Świerkla do Szkoły Podstawowej – skrzyżowanie z dr. Stronie” Dąbrowa” – „, Dobra Woda”)

Wartość całkowita zadania: **2 387 364,55 brutto** (w tym wykonawstwo chodnika – 2.232.459,35 zł. , dokumentacja projektowa – 53.997,00 zł., oświetlenie uliczne – 64.408,20 zł. , nadzór inwestorski – 36.500,00 zł.)

Finansowanie w ramach IS w relacji 50/50: Inwestor G. Łukowica

- Powiat Limanowski – 1 161 478,00 zł. brutto

- Gminy Łukowica – 1 225 886,55 zł. brutto

Wydatek poniesiony w roku **2021-** 500.000,00 zł środki Powiatu

Inwestor : Gmina Łukowica , zakończenie zdania rok 2022.

Wykonawca : Firma „ZIBUD” Sp. z o.o, Sp. Komandytowa z Kamienicy

INNE - INICJATYWY SAMORZĄDOWE

Gmina Łukowica

„Wymiana nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 1579K Siekierzyna – Naszacowice w km 4+638 – 4+878 w miejscowości Przyszowa” – odcinek długości 240 mb

Zakres : wykonanie nowej nawierzchni jezdni szer. 6,0mb,

Wartość zadania: **94.065,48 zł**. Finansowanie IS w relacji 50/50:

- Powiat Limanowski – 47.065,48 zł.
- Gmina Łukowica – 47.000,00 zł.

Wykonawca PROFEXIM Spółkę Jawną H.J. Duda



Gmina Kamienica

Zadanie nr 1

„Utwardzenie poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 1609K Limanowa – Kamienica w km 15+119 – 15+637 w m. Zalesie” – odcinek długości 0,5 km

Zakres: utwardzenie poboczy, w tym lewostronnego poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej o szer. 1,0 m oraz prawostronnego poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową.

Wartość zadania: **149.048,66 zł**. Finansowanie IS w relacji 50/50:

- Powiat Limanowski – 74.524,66 zł.
- Gmina Kamienica – 74.524,00 zł.

Wykonawca: Zakład Usług Budowlanych Mariusz Siwek, Nowy Sącz



Zadanie nr 2

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1609K Limanowa - Kamienica w km 18+740 – 18+747 w m. Zbludza poprzez przebudowę przepustu drogowego”

Zakres: przebudowa drogi powiatowej nr 1609K Limanowa - Kamienica w km 18+740 – 18+747 w m. Zbludza poprzez przebudowę przepustu drogowego.

Zakres : wykonanie przepustu ramowego 3,0x15 m , umocnienie wlotu i wylotu, odmulenie rowu przydrożnego , montaż barier ochronnych

Wartość zadania: **46.708,06 zł.** Finansowanie IS w relacji 50/50:

- Powiat Limanowski – 23.354,06 zł.

- Gmina Kamienica – 23.354,00 zł.

Wykonawca: Firma DROGBUD s.c. Stanisław Staško - Słopnice



ŚRODKI WŁASNE - zadania

Gmina Jodłownik

Zadanie nr 1

„Przebudowa pobocza w ciągu drogi powiatowej 1632K Kępanów Tymbark w km 6+613-7+929 w m. Mstów i Jodłownik”

Zakres zadania: wykonanie utwardzonego pobocza bitumicznego na odcinku 1316 mb , szerokości 1,0mb , wykonanie odwodnienia, umocnienie wlotów przepustów.

Wartość całkowita zadania : **297 957,41zł.** (w tym wykonawstwo 289.101,41 zł opracowanie kosztorysu, przedmiar 4.182,00 zł, nadzór inwestorski 4.674,00 zł.)

Wykonawca : Firma „ZIBUD” Sp. z o.o, Sp. Komandytowa z Kamienicy

Zadanie nr 2

„Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1623K Zegartowice – Góra Jana – Szczyrzyc w km 3+450 – 3+700 w m. Góra Jana” – odcinek długości 250 m. (strona prawa od granicy Powiatu do wysokości Kościoła)

Zakres: roboty przygotowawcze i remontowe odwodnienia (rowy, przepusty), utwardzenie pobocza bitumicznie , oznakowanie poziome.

Wartość całkowita zadania: **92.347,80 zł.** (w tym wykonawstwo: 89.002,80 zł., przedmiar + nadzór 3.345,00 zł.)

Finansowanie:

Wykonawca: DROGBUD s.c. Stanisław Staśko , Słopnice



Miasto Mszana Dolna.

„Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1625K Tenczyn – Glisne – Mszana Dolna w km 6 + 955 – 8 + 176 w m. Mszana Dolna, ul. Zarabie” – na odcinku 1,2 km.

Zakres: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, remont odwodnienia, likwidacja przełomów i zapadnięć, utwardzenie pobocza, wykonanie wzmocnienia jezdni geosiatką, położenie nawierzchni bitumicznej, oznakowanie drogowe

Wartość całkowita zadania: **1.539.753,80 zł.** (w tym wykonawstwo : 1.520.000,00 zł. przedmiar + nadzór 19.753,80 zł.)

Finansowanie:

- Powiat Limanowski – **1.539.753,80 zł.**

Wykonawca: W.P.P.U.H. JANDA, Łostówka



„Remont drogi powiatowej nr 1619K Tarnawa-Nowe Rybie-Rupniów – wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni na osuwiskach w m. Nowe Rybie i Rupniów”

Wartość zadania - **140.098,30 zł.** (w tym wykonawstwo: 133.333,30 zł.)

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LIMDROG Sp. z o.o. z Limanowej.

„Remont drogi powiatowej nr 1632K Kępanów-Tymbark – wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni na osuwisku w miejscowości Tymbark”

Wartość zadania - **27.118,98 zł.**

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LIMDROG Sp. z o.o. z Limanowej.

Zadanie - Regulacja prawna nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe ze stanem na 01.01.1999r.

pn. „Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych wraz ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjno-prawnej dla celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy w latach 2021-2023”

1) Zadanie częściowe nr 1 - Regulacja stanu prawnego odcinków dróg powiatowych nr 1579K, 1613K i 1618K (umowa nr U/3/2021 z dnia 20.07.2021 r.)

2) Zadanie częściowe nr 2 - Regulacja stanu prawnego odcinków dróg powiatowych nr 1609K, 1614K, 1620K, 1625K, 1626K i 1555K (umowa nr U/4/2021 z dnia 20.07.2021 r.)

3) Zadanie częściowe nr 3 - Regulacja stanu prawnego odcinków dróg powiatowych nr 1616K, 1628K i 1629K (umowa nr U/5/2021 z dnia 20.07.2021 r.)

Planowane wydatki w latach 2021-2023 – **700.000,00 zł**

Wykonane wydatki w roku 2021 – **145.900,00 zł**

Wykonawcy:

1) GEO-ART Geodezja i Budownictwo z Czarnego Dunajeca, reprezentowane przez Geodetę uprawnionego Justynę Polaczek (zadanie częściowe nr 1 i 3)

Planowane wydatki w latach 2021-2023 – **490.000,00 zł**

Wykonane wydatki w roku **2021** – **90.000,00 zł**

2) Marcin Kolasa „GEOPROJEKT” Zakład Usług Geodezyjno-Kartograficznych z Krakowa (zadanie częściowe nr 2)

Planowane wydatki w latach 2021-2023 – **209.844,00 zł**

Wykonane wydatki w roku **2021** – **55.900,00 zł**

DOKUMENTACJE PROJEKTOWE DROGOWE

1. Mając na uwadze planowane ubieganie się dofinansowanie kolejnych trzech zadań drogowych ze środków RFRD w kolejnych edycjach w ramach wspólnej inicjatywy z samorządami gminnymi podjęto działania opracowania dokumentacji projektowych chodników, poboczy utwardzonych:

a/ z Gminą Niedźwiedź (inwestor)

- „Przebudowa drogi powiatowej 1630K Niedźwiedź – Konina w m. Konina od Kościoła (od istniejącego chodnika) do osiedla Halamy”, - (1,6 km- w toku opracowania)
- „Przebudowa drogi powiatowej 1630K Niedźwiedź – Konina w m. Konina od oś. Michalczewscy do istniejącego chodnika na oś. Pazyrówka”, - (1,7 km w toku opracowania)

b/ z Gminą Mszana Dolna (inwestor):

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1627K Raba Niżna – Olszówka w km od 0+000 do km 4+647 w miejscowości Raba Niżna i Olszówka -Powiat Limanowski” (w toku opracowania)
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1626K Kasinka Mała-Węglówka-Kasina Wielka w km od 6+876 do km 8+576 w miejscowości Kasina Wielka – wykonanie chodnika wraz z oświetleniem ulicznym” - (w toku opracowania)
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 Mszana Górna-Wilczyce w km od 2+850 do km 5+610 w miejscowości Łętowe - Powiat Limanowski” -wykonanie chodnika wraz z oświetleniem ulicznym (wykonano PT 2021)

c/ z Gminą Łukowica (inwestor)

- „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1580K Zalesie -Jadamwola -Olszana odcinek I w km od 1+520 do km 2+680 w miejscowości Młyńczyska , odcinek II w km od 7+050 do km 12+252 w miejscowości Młyńczyska, Jastrzębie i Jadamwola – Powiat Limanowski” - wykonanie chodników, pobocza bitumicznego, nawierzchnia jezdni wraz z poszerzeniem ((w toku opracowania)
- „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1610K Świdnik -Limanowa w km 4+388 -5+498 w m. Łukowica” (poszerzenie i wykonanie nawierzchni bitumicznej , utwardzenie pobocza kostką brukową , odwodnienie) (opracowano PT – 2021)
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1545K Podegrodzie – Mokra Wieś – Jastrzębie w miejscowości Stronie w km 6+994,57 – 7+817,32” -wykonanie chodnika wraz z oświetleniem ulicznym , (od skrzyżowania z dr. gminną Stronie – Świerkla do Szkoły Podstawowej – skrzyżowanie z dr. Stronie” Dąbrowa” – „ Dobra Woda”)- (opracowano PT 2021)
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1545K Podegrodzie – Mokra Wieś – Jastrzębie w km 10+860 – 11+045 w miejscowości Łukowica tzw. Czartowska - chodnik , odwodnienie

d/ na wniosek Gmin: Słopnice i Dobra -opracowano uproszczoną dokumentację projektowo-kosztorysową:

„Remont drogi powiatowej nr 1614K Słopnice -Chyszówki-Jurków w km od 0+000 – 10+595 w m. Słopnice, Chyszówki i Jurków”.

Koszt opracowania dokumentacji - 114.390,00 zł. brutto - środki Powiatu Limanowskiego

Wykonawca :F.U.H. „RENOWA” Krzysztof Waniczek z Kluszkowce

e/ na wniosek Gminy Niedźwiedź i Miasta Mszana Dolna

opracowano dokumentacji uproszczonej:

„Remont drogi powiatowej nr 1629K Mszana Dolna -Hucisko na odcinku I w km od 0+050 do km 5+254, w miejscowości Mszana Dolna, Podobin i Niedźwiedź - Powiat Limanowski”. – odcinkowa położenie nowej nawierzchni bitumicznej, remont chodnika, utwardzenie poboczy bitumicznie, oznakowanie drogowe, wymiana opraw oświetlenia ulicznego

Koszt opracowania PT - 23.985,00 zł. - środki Powiatu Limanowskiego

Wykonawca Zakład Budowlany Janusz Burkat

f/ z Gminą Tymbark [IS]

„Przebudowy skrzyżowania drogi krajowej DK28 z drogą powiatową nr 1632K Kępanów - Tymbark oraz drogą gminną „Do Noku” w formie czterowłotowego ronda” .

W toku opracowania – zakończenie dokumentacja przesunięta do września 2022 r

Wartość zadania : **116.800,00 zł**. Finansowanie w relacji 50/50:

- Powiat Limanowski – 58.400,00zł.
- Gmina Tymbark - 58.400,00 zł.

g/. Dokumentacja projektowo-budowlana „**Stabilizacji osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna Podłopień w km 10+525-10+565 w miejscowości Jurków**” .

Wartość zadania : **77.490,00 zł**.

Finansowanie:

- Urząd Wojewódzki - **61.992,00 zł**. (80%)
- Powiat Limanowski – **15.498,00 zł**. (20%)

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Geologiczna S.A. Kraków

h/. Dokumentacje projektowo-kosztorysowe (obiekty mostowe)

- „**Przebudowa obiektu mostowego JNI 35000255 w km 1+670 w ciągu drogi powiatowej nr 1609K Limanowa - Kamienica w miejscowości Stara Wieś wraz z przebudową jezdni i pobocza na dojazdach**”

Wykonawca PBI Kamil Jędrzejek – **54.366,00zł** (*zadanie zgłoszone do wydatków niewygasających z upływem roku 2021*)

- „**Przebudowa obiektu mostowego JNI 35000259 w km 17+889 w ciągu drogi powiatowej nr 1609K Limanowa - Kamienica w miejscowości Zbludza wraz z przebudową jezdni i pobocza na dojazdach**”

Wykonawca PBI Kamil Jędrzejek – **53.997,00zł** (*zadanie zgłoszone do wydatków niewygasających z upływem roku 2021*)

- „**Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1625K Tenczyn - Glisne - Mszana Dolna w km 5+714 w miejscowości Glisne**”

Wykonawca PBI Kamil Jędrzejek – koszt : **23.370,00 zł**

- Wykonano dokumentację projektową oświetlenia dedukowanego dla zadania pn.: „**Budowa przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1609K w miejscowości Limanowa**”

Wykonawca Firma JAREK Jarosław Kowalski – **5.535,00zł** – *zaliczone do nakładów poniesionych na budowę przejść dla pieszych*

=====

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

Służbami PZD na bieżąco wykonywane są prace porządkowe tj. *czyszczenie z namułu korytek wodościekowych, uzupełnianie i wymiana uszkodzonego oznakowania drogowego, uzupełnianie ubytków kruszywem w poboczach oraz masą bitumiczną na zimno ubytków w jezdni , wycinka zarośli, usuwanie namulisk, zbieranie śmieci na wyznaczonych odcinkach dróg, koszenie traw wzdłuż dróg, wszelkie roboty naprawcze urządzeń w infrastrukturze drogowe (studzienki kanalizacyjne , kratki wodościekowe , dokonywanie nasadzeń drzewek, malowanie barier mostowych itp. Ponadto przez firmę zewnętrzną przeprowadzone było` zbieranie śmieci na drogach powiatowych wskazanych przez PZD.*

Cześć usług związanych z bieżącym utrzymaniem była wykonywana firmami zewnętrznymi dot. zbieranie śmieci na drogach powiatowych wskazanych przez PZD, wycinki i pielęgnacji drzew, odmulania rowów i ścinania poboczy, remontu cząstkowego jezdnii emulsją i grysami, remontu uszkodzonych barier ochronnych. W związku z zakupem farb wykonywane było także we własnym zakresie służbami PZD oznakowanie poziome jezdnii – malowanie linii krawędziowych i przejść dla pieszych.

Pod koniec czerwca 2021r. , jak co roku służba liniowa PZD przygotowywała drogę powiatową nr 609K w m. Stara Wieś/Roztoka na całej trasie pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa zarówno uczestników jak i kibiców samochodowego wyścigu górskiego „Przełęcz pod Ostrą”.

Oprócz bieżącego utrzymania dróg powiatowych jak i obiektów infrastruktury drogowej w okresie zimowym przez służby PZD prowadzona i nadzorowana jest akcja zimowego utrzymania dróg powiatowych dla zapewnienia bezpieczeństwa i przejezdności na drogach powiatowych w tym także utrzymania chodników. Zimowe utrzymanie dróg wykonywane jest służbami zewnętrznymi tj. wykonawcami wyłonionymi w postępowaniach przetargowych. Drogi powiatowe podzielone są na odcinki (zadania). Każdemu zadaniowi przypisany jest jeden wykonawca posiadający odpowiedni sprzęt specjalistyczny (pługopiaskarkę) zgodnie z wymogami SST. Drogi powiatowe obsługuje 18 pługopiaskarek. Akcja zimowego utrzymania dróg [ZUD] w sezonie 2021/2022 rozpoczęła się (25-11-2021)- dla odcinków dróg wymagających świadczeń usług, Na ZUD w sezonie zimowym 2021/2022 PZD zarezerwowano w budżecie środki w wysokości 300 tys zł. (dotyczy ZUD do końca roku 2021), natomiast w planie finansowym na 2022 r zapisano kwotę wydatku związaną z kosztami ZUD w wysokości 4.000.000,00 zł.

Wydatki bieżące związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w roku 2022 zamknęły się kwotą :

5.227.407,11 zł. w tym :

- za sezon 2020/2021 - 5.047.050,12 zł. (ogółem sezon ZUD 2020/2021 – 5.314.430,96 zł.)
- za senon 2021/2022 - 180.356,99 zł.

Z E S T A W I E N I E R Z E C Z O W O - F I N A N S O W E - r o k 2 0 2 1

- położenie nowej nawierzchni asfaltowej - **4,9 km** [4 868 mb]
- wybudowano chodniki - **3,5 km** [3471 mb]
- wybudowano pobocza utwardzone bitumicznie [szer. 1,0 m] - **2,1 km** [2 084 mb]
- przebudowa obiektów mostowych - **2 sztuki**
- przebudowa przepustów drogowych - **1 sztuka**

WYDATKI na wykonanie zadań drogowych w roku 2021 - **33.755.887,54 zł.**

- w tym: - poniesione przez PZD - **33.200.425,54 zł.**
- przez JST (*Gmina Łukowica chodnik Stronie, Przyszowa*) - **555.462,00 zł.**

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO (wydatek)– OGÓŁEM:

13.781.286,45 zł.

w tym:

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 9.793.789,45 zł.
- Rezerwa subwencji ogólnej - 1.428.318,00 zł.
- Budżet państwa (*osuwiska*) - 61.992,00 zł.
- Gminy - JST - 2.497.187,00 zł.

=====

Środki zewnętrzne pozyskane w roku 2021: ogółem : 23.424.103,00 zł.

W tym:

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (*drogi*) - 18.942.377,00 zł.
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (*przejścia*) - 494.229,00 zł.
- Rezerwa subwencji ogólnej - 1.428.318,00 zł.
- Budżet państwa (*osuwiska*) - 61.992,00 zł.
- Gminy - JST - 2.497.187,00 zł.

Limanowa dn. 29.03.2022r.
