

## SPRAWOZDANIE

### w zakresie realizacji zadań w infrastrukturze drogowej na drogach powiatowych na terenie Powiatu Limanowskiego w roku **2023** przez Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej .

Coroczną działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej stanowią działania w zakresie dbałości o infrastrukturę drogową na terenie Powiatu Limanowskiego celem zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiednich warunków komunikacyjnych na drogach powiatowych. Podejmowane jak corocznie działania w tym zakresie oprócz bieżącego utrzymania całej infrastruktury drogowej (*nawierzchnie dróg, obiekty mostowe, przepusty, chodniki, oznakowanie drogowego itp.*) obejmowały liczne działania inwestycyjno-remontowe. Realizacja zadań bieżącego utrzymania czy realizacji zadań inwestycyjnych wymagała zabezpieczenia ze strony samorządu Powiatu znacznych środków finansowych.

Poniesione wydatki finansowe uwzględnione w planie finansowym PZD na drogach powiatowych w roku **2023** kształtują się na poziomie **ok. 59 mln. zł.** w tym wydatki inwestycyjno -remontowe na poziomie **48 mln zł.** Dużym wsparciem dla prowadzonych jak i planowanych działań były pozyskiwane przez Powiat środki zewnętrzne z budżetu państwa sięgające kwoty **37 mln zł.** w ramach dostępnych programów pomocowych ze środków budżetu państwa (*Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, programu Ochrony Przeciwosuwiskowej, program strategiczny POLSKI ŁĄD , Fundusz Leśny, rezerwy subwencji ogólnej*), oraz partnerów lokalnych -jednostek samorządu terytorialnego.

Rok 2023 to kolejne działania związane z poprawą istniejącej infrastruktury drogowej.

### Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

W ramach pozyskanych przez Powiat Limanowski środków finansowych z programu pomocowego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach poprzednich (*zadania trzyletnie*) kontynuowana była realizacja następujących zadań drogowych :

**Zadanie nr 1.** (*kontynuacja: rozpoczęcie rok 2021, zakończenie rok 2024*)

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 K Łososina Dolna –Ujanowice – Młynne na odcinku I w km 5+831 do km 12+000, na odcinku II w km od 12+000 do km 15+902 w miejscowości Kobyłczyzna, Ujanowice, Strzeszyce, Krosna, Kamionka Mała, Laskowa, Powiat Limanowski” - przebudowa na odcinku 10,071 km.**

Zakres całkowity zadania obejmuje dostosowanie drogi do ruchu ciężkiego poprzez wykonanie: odcinkowej pełnej wymiany konstrukcji jezdni z użyciem środka hydrofobowego, wzmocnienie konstrukcji drogi siatką stalową, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, wzmocnienie pobocza drogi wraz z częściowym utwardzeniem bitumicznie, odcinkowe wykonanie chodników w m. Strzeszyce, Kamionka Mała i Laskowa, wykonanie ścieżki rowerowo-pieszkiej pomiędzy mostami w Laskowej, zatok autobusowych, oświetlenia ulicznego wzdłuż realizowanych chodników , ścieżki oraz zatok autobusowych.

W związku z odstąpieniem od dalszego wykonawstwa zadania przez wykonawcę: P.D.M. LIMDROG Sp. z o.o. z Limanowej, pomimo wezwań do ich kontynuowania – mając na uwadze konieczność realizacji dalszych robót przy wykorzystaniu przyznanego dofinansowania z RFRD dokonano rozwiązania umowy z w/w wykonawcą, a tym samym

przeprowadzono nowe postępowanie przetargowe na wyłonienie kolejnego wykonawcy celem kontynuacji dalszego zakresu przedmiotowego zadania.

Zakres robót pozostałych do wykonania obejmował: odcinek I w km 5+831–8+250 [ dl. 2,4 km ] obejmujący m. Kobyłczyna, Ujanowice Strzeszyce oraz odcinek II w km 12+000 – 15+902 [dl. 3,9 km] obejmujący m. Kamionka Mała a Laskowa ( do mostu k/ Kościoła ). Ogółem długości **7,6 km**.

Zakres robót do wykonania obejmuje:

Odcinek I - wykonanie zatoki autobusowej w m. Kobyłczyna, odcinkowe wymianę konstrukcji drogi wraz z jej wzmocnieniem rejon pomiędzy CPN w Ujanowicach a Strzeszycami, likwidację przełomów zapadnięć, utwardzenie pobocza drogi, położenie nowych warstw bitumicznych wraz z wzmocnieniem siatką stalową, regulacja odwodnienia liniowego wzdłuż drogi, przebudowę zjazdów, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z oznakowaniem drogowym.

Odcinek II – odcinkową pełną wymianę konstrukcji drogi wraz z wzmocnieniem obejmujący miejscowości Kamionka Mała - Laskowa, likwidację zapadnięć i przełomów, wzmocnienie pobocza drogi, regulację odwodnienia liniowego, umocnienie odcinkowe skarp drogi, wykonanie ścieżki rowerowo-pieszkiej pomiędzy mostami w Laskowej, położenie nowych warstw bitumicznych jezdni wraz z wzmocnieniem siatką stalową i częściowym utwardzeniem bitumicznie pobocza drogi, wykonanie nawierzchni utwardzonej zatoki autobusowej w rejonie mostu łukowego, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z oznakowaniem drogowym.

Wykonawcą kontynuacji realizacji w/w zakresów zadania w czasookresie 2023/2024 w wyniku przeprowadzonego przetargu została Firma **STRABAG**, oddział w Tarnowie z którą została zawarta umowa.

Wartość wykonania zadania z Firmą STRABAG wynosi - **21.832. 851,08 zł. brutto**

Plan finansowy PZD zadania przewidziany w WPF na rok 2023 – **10.542.916,00 zł. .**,  
( wykonanie 8.945.560,69 zł. – 88% ) na rok 2024 - **11.900.000,00 zł.**

Wykonawca zadania : Firma **STRABAG** , oddział w Tarnowie.

*Zakres robót wykonanych w roku 2023 zgodnie z harmonogramem robót koncentrował się na II odcinku i związany był z wykonaniem pełnej wymiany odcinkowej konstrukcji drogi wraz z jej wzmocnieniem. Roboty były prowadzone odcinkowo z zapewnieniem przejezdności wahadłowo.*

Wartość robót wykonanych przez poprzedniego wykonawcę P.D.M. LIMDROG za okres 2021/2023 wyniosła kwotę: 9.940.634,90 zł. (*odcinek obejmujący miejscowości Strzeszyce i Kamionka Mała w km 8+250 do 12+000 - dl. 3,75 km*)



Odcinek Strzeszyce – Kamionka Mała



Odcinek Kamionka Mała - Laskowa

**Zadanie nr 2.** ( kontynuacja: rozpoczęcie rok 2022 zakończenie rok 2024 )

**1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 Mszana Górna-Wilczyce w km od 2+850 do km 5+610 w miejscowości Łętowe - Powiat Limanowski”**

- odcinek dł. **2,8 km** kontynuacja od Szkoły Podstawowej do pogranicza m. Wilczyce.

Zadanie w systemie trzyletnim 2022/2024

Zakres zadania obejmuje :*wykonanie chodnika, regulacja odwodnienia , przebudowa przepustów, wykonanie zabezpieczeń brzegowych - palowanie, likwidacja przelomów, zapadnięć , wzmocnienie konstrukcji jezdni geosiatką, wykonanie nawierzchni bitumicznej, wzmocnienie pobocza wraz z częściowym utwardzeniem bitumicznie , oświetlenie uliczne, wykonanie zjazdów, wykonanie przejść dla pieszych , oznakowanie drogowe pionowe i poziome .*

Wartość całkowita zadania: **12.160.970,00 zł. brutto** w tym ( wykonawstwo: – całościowe 12.060.000,00zł; nadzór inwestorski – 44.970,00zł, pozostałe nakłady wraz z promocją 56.000,00 zł. )

Zadanie w partnerstwie z Gminą Mszana Dolna .

Finansowanie :

- RFRD budżet państwa - 6.014.075,00zł (50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania)
- Powiat Limanowski - 4.516.000,00 zł
- Gmina Mszana Dolna - 1.630.895,00 zł


Plan finansowy zadania w WPF na rok 2023 - 4.612.884,00 zł., rok 2024 – 2.307.086,00 zł.

Wykonanie roku 2023 kwota : **4.612.884,00 zł.** w tym RFRD : – 214.075,00 zł.

Wykonawca zadania : W.P.P.U.H. „JANDA” z Łostówki

Termin zakończenia – czerwiec 2024

Zakres wykonany: *roboty chodnikowe wraz z zabezpieczeniem i odwodnieniem, została położona ostatnia warstwa nawierzchni bitumicznej ( warstwa ścieralna ), przebudowa przepustów drogowych, roboty wykończeniowe*

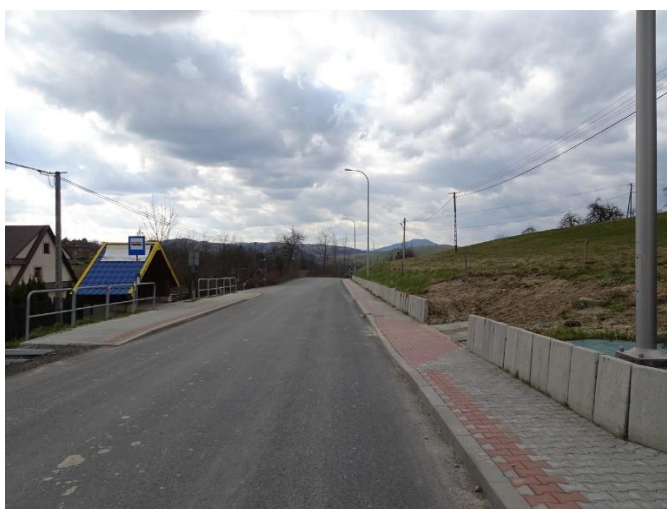

**Zadanie nr 3** (kontynuacja rozpoczęcie rok 2022 zakończenie rok 2024)

**„Remont drogi powiatowej nr 1629K Mszana Dolna -Hucisko w km od 0+050 do km 5+254, w miejscowości Mszana Dolna, Podobin i Niedźwiedź - Powiat Limanowski” – odcinek dł. 5,2 km ( od ronda ul. Orkana do wysokości Szkoły Podstawowej w m. Niedźwiedź) w systemie trzyletnim 2022/2024.**

Zakres zadania: odcinkowa wymiana nawierzchni chodnika oraz nawierzchni bitumicznej jezdni w ul. Orkana w Mszanie Dolnej ( odcinek od Ronda dł. 516 mb ), położenie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni na pograniczu m. Podobin/Niedźwiedź ,regulacja odwodnienia, wzmocnienie i utwardzenie bitumicznie poboczy drogi , utwardzenie bitumicznie placu postojowego na wysokości tzw. Strefy przemysłowej przy ul. Orkana , na odcinku ul. Orkana – Podobin - strona lewa pobocze bitumiczne szer. 1,5 m , oznakowanie drogowe pionowe i poziome w tym przejść dla pieszych, wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne.

Wartości zadania : **4.850.000,00 zł.** ( w tym wykonawstwo : 4.800.067,26 zł. brutto )

Uzyskane dofinansowanie z RFRD - w wysokości :1.374.417,00 zł.

Zadanie w partnerstwie z Miastem Mszana Dolna i Gminą Niedźwiedź.

- Miasto Mszana Dolna - 313.748,00 zł. ( rok 2022 -100.000,00 zł., rok 2023- 100.000,00 zł., rok 2024- 113.748,00 zł. )
- Gmina Niedźwiedź - 500.000,00 zł. ( rok 2023- 200.000,00 zł., rok 2024 – 300.000,00zł.)
- Udział Powiatu Limanowskiego - 2.661.835,00 zł

Wydatek finansowy w WPF na rok 2023 – 1.474.417,00 zł. , rok 2024 – 2.075.583,00 zł.

Wykonanie roku 2023 :kwota 1.474.417,00 zł. w tym ( RFRD – 174.417,00zł. , Powiat – 1.000.000,00 zł., Miasto Mszana Dolna – 100.000,00 zł., Gmina Niedźwiedź – 200.000,00 zł.)

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „DUDA” Grażyna Duda z Łostówki

Zostały wykonane roboty związane z wykonaniem wzmocnienia poboczy drogi , wykonano nawierzchnię bitumiczną jezdni wraz jej poszerzeniem na pograniczu miejscowości Podobin i Niedźwiedź w zakresie przewidzianym zadaniem, wykonano regulację studzienek wodościekowych, roboty przygotowawcze pod wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z wykonaniem podbudowy bitumicznej ( *warstwa wiążąca* ) w ul. Orkana oraz także utwardzenie bitumicznie ( *warstwa wiążąca* ) pozostałego zakresu poboczy ul. Orkana i Podobin.



-----

W ramach uzyskanego przez Powiat dofinansowania zadań drogowych z **RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG** na rok 2023 zrealizowano kolejne zadania drogowe:

#### **Zadanie nr 1 .**

**„ Przebudowa drogi powiatowej nr 1451 K Wojakowa – Sechna – Ujanowice w km od 7+482 do km 8+070 w miejscowości Ujanowice, Powiat Limanowski ”**  
(*odcinek dł.588 mb* )

Wykonano chodnik w m. Ujanowice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1555K w kierunku Sechny / *wzdłuż istniejących zakładów produkcyjnych na długość 473mb, utwardzono pobocze z krawężnikiem na docinku 97,0 mb /*

Całkowita wartość zadania : **1.416.000,00 zł. brutto** ( w tym : wykonawstwo 1.400.000,00 zł., nadzór inwestorski - 14.000,00 zł., promocja 2.000,00 zł. )

Finansowanie kształtowało się następująco:

- dofinansowanie z RFRD - 674 867,00 zł. [ 50%]
- Powiat Limanowski - 369 567,00 zł. [ 25% ]
- Gmina Laskowa - 369.566,00 zł. [ 25% ]

Zakres zadania : *wykonano odwodnienie – kanalizacja opadowa , chodnik z kostki brukowej szer. 2,0mb, zjazd, utwardzono kruszywem pobocze wraz z krawężnikiem , poszerzenie bitumiczne jezdni , oznakowanie drogowe tzw. radar, zamontowano bariery zabezpieczające typu U-12.*

Dodatkowo w ramach IS w relacji 50/50 zamontowano bariery ochronne typu U-12 dla zapewnienia bezpieczeństwa pieszych z uwagi na znaczną różnicę terenu pomiędzy chodnikiem a przyległym poniżej terenem, oraz utwardzono plac postojowy na wysokości budynku OSP Ujanowice z uwzględnieniem części pasa drogowego poza chodnikiem.

Koszt wykonania robót dodatkowych wyniósł: **51.665,39 zł. brutto.**

przy finansowaniu 50/50 :

- Powiat Limanowski - 25.883,39 zł.
- Gmina Laskowa - 25.832,00 zł.

Wykonawca zadania: P.P.U.H. JANDA z Łostówki

Ogółem wartość całkowita zadania: **1.467.665,39 zł.** w tym wykonawstwo: **1.451.665,39 zł.**



## **Zadanie nr 2 .**

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 1580 K Zalesie – Jadamwola - Olszana w km od 10+178 do km 12+252 etap I w km od 10+178 do km 11+320 w miejscowości Jadamwola, Powiat Limanowski” [ dł.1,142 km ]**

Zakres : wykonano chodnik szer. 2,0 mb, regulację odwodnienia ( kanalizacja opadowa, korytka wodościekowe ) poszerzenie i wykonanie nowej nawierzchni jezdni szer. 6,0 mb wraz z wzmocnieniem geosiatką, utwardzenie pobocza w tym utwardzenie w ½ bitumicznie ,dwa przejścia dla pieszych z oświetleniem dedykowanym , pasami akustycznymi, oznakowanie drogowe ( pionowe i poziome ), zamontowano tzw. *radar* – tablicę wyświetlającą prędkość zasilaną solarnie.

Wartość zadania : **3.669.967,23 zł brutto** (w tym: wykonawstwo 3.639.967,23 zł., nadzór inwestorski – 30.000,00 zł.)

Finansowanie zadania :

- budżet państwa RFRD - 1.812.191,00 zł. ( 50% dofinansowania )
- budżet państwa rezerwa subwencji ogólnej – 1.123.782,78 zł. ( 30% dofinansowania )
- Powiat Limanowski - 218.486,45 zł.
- Gmina Łukowica - 515.507,00 zł. ( 50% w kosztach własnych chodnika )

Wykonawcą zadania jest : Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „DUDA” Grażyna Duda z Łostówki



W ramach lutowego ww naboru wniosków o dofinansowanie w roku 2023 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na „*remonty dróg*” – Powiat Limanowski otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu państwa, oraz ze środków Funduszu Leśnego na wykonanie zadania pn:

**„Remont drogi powiatowej nr 1613K Zamieście- Słopnice-Zalesie w km od 7+207 do km 8+558 w miejscowości Słopnice, Powiat Limanowski”**

Obszar realizacji zadania obejmował poprawę warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na drodze powiatowej relacji Zamieście- Zalesie w miejscowości Słopnice „*Górne*” – (rejon Szkoły Podstawowej, oraz oś. Piechoty i Pachuty)- odcinek 1351 mb .

Zakres zadania Firmy DROGBUD obejmował: roboty przygotowawcze, likwidację zapadnięć i przełomów w jezdni , regulację odwodnienia, utwardzenie poboczy, remont chodnika, wykonanie przejść dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym z oprawami o asymetrycznym rozsyle strumienia i dostosowaniem do potrzeb osób z dysfunkcją ruchu i wzroku poprzez fakturowe wykonanie oznakowania nawierzchni na części chodnika, montaż tablic informacyjnych o obowiązującej prędkości tzw, *radarów* , remont nawierzchni na zatoce , oznakowanie drogowe zarówno pionowe i poziome, wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni w rejonie Szkoły Podstawowej

Zakres zadania firmy PDM LIMDROG obejmował: roboty bitumiczne w rejonie pomiędzy istniejącymi mostami oś. *Piechoty* a oś. *Pachuty* w km 7+740 – 8+558 odcinek ok. 820 mb : frezowanie nawierzchni, wykonanie warstwy wyrównawczej, wzmocnienie nawierzchni

geosiatką, wykonanie warstwy ścieralnej, wykonanie pobocza z kruszywa z powierzchniowym utwaleniem emulsją.

Wartość w/w zakresu robót zadania : **2.061.031,75 zł. brutto** ( w tym wykonawstwo : 2.037.031,75 zł . tj. 1.265.320,52 zł. -DROGBUD ; 771.711,23 zł.- PDM LIMDROG ; 24.000,00 zł. - nadzór inwestorski. )

Finansowanie zadania :

- RFRD budżet państwa - 942.908,00 zł. (80% dofinansowania zakresu DROGBUD)
- Powiat Limanowski - 282 940,75 zł.
- Fundusz Leśny - 835 183,00 zł. (41% kosztów zadania wykonawczego)

Wykonawca: Firma DROGBUD – P. Stanisław Staśko z Słopnic, natomiast wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z poboczem, oznakowaniem poziomym na odcinku 820 mb. ( os. Piechoty i Pachuty ) - firma PDM LIMDROG Sp. z o.o. z Limanowej .



-----

W ramach pozyskanego 80% dofinansowania z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu** – Powiat zrealizował w roku 2023 trzy kolejne zadania dla poprawy warunków bezpieczeństwa pieszych :

Zadanie nr 1:

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 1619 K Tarnawa – Stare Rybie – Rupniów w km od 9+400 do km 9+885 w miejscowości Rupniów, Powiat Limanowski”** - obejmuje budowę chodnika dla pieszych w km 9+400 – 9+885 w miejscowości Rupniów (dł. 485 mb).

Zakres zadania : roboty przygotowawcze, odwodnienie – kanalizacja opadowa, chodnik o nawierzchni z kostki brukowej szer. 2,0mb, poszerzenie jezdni do szer. 6,0mb, oznakowanie drogowe.

Wartość całkowita zadania: **1. 250 890,75 zł.** w tym: wykonawstwo – 1.236.490,75 zł., nadzór inwestorski – 14.400,00 zł.

Finansowanie zadania przedstawia się następująco:



- budżet państwa RFRD - 945. 732,00 zł. (80% kosztów kwalifikowanych 1 182 165,00 zł)
- Powiat Limanowski - 170 824,75 zł. ( 50% kosztów własnych 268 668,00 zł. )
- Gmina Limanowa - 134. 334,00 zł. ( 50% kosztów własnych 268 668,00 zł. )



#### Zadanie nr 2:

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 K Stadła – Długolęka – Przyszowa w km od 9+073,58 do km 9+379,57 wraz z przejściem dla pieszych w km 9+135,65 w miejscowości Przyszowa, Powiat Limanowski”**

Zakres zadania: budowa chodnika dla pieszych w km 9+073,58 – 9+181,32 ( dł. 108 mb ), budowa przejścia dla pieszych w km 9+135,65 wraz z dedykowanym oświetleniem z oprawami o asymetrycznym rozsyle strumienia , wykonanie oświetlenia ulicznego ( dł. 306 mb )

Partner zadania: Gmina Łukowica.

Wartość całkowita zadania: **380 000,00 zł.** w tym: wykonawstwo – 380.000,00 zł. ,

Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

- budżet państwa RFRD - 292.211,00 zł. ( 80% kosztów kwalifikowanych 366 089,20 zł)
- Powiat Limanowski - 22 294,00 zł. ( 50% kosztów własnych chodnika. )
- Gmina Łukowica - 66.495,00 zł. ( 50% kosztów własnych chodnika i 100% kosztów własnych oświetlenia ulicznego)

Wykonawca zadania: P.P.U.H. JANDA z Łostówki



### Zadanie nr 3.

#### **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1612 K Laskowa – Nagórze wraz z przejściami dla pieszych w km 0+074,50 oraz w km 2+099 w miejscowości Laskowa, Powiat Limanowski”**

– obejmuje budowę 2 przejść dla pieszych ( w rejonie szkoły podstawowej w Laskowej oraz skrzyżowania z DW 965) wraz z dedykowanym oświetleniem z oprawami o asymetrycznym rozsyłe strumienia , montaż oznakowania aktywnego( **pulsatory**), dostosowanie przejścia do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchu i wzroku poprzez wykonanie fakturowego oznakowania nawierzchni na części spocznika ( tzw. *Brail* ), wykonanie oznakowania drogowego ( *pasy akustyczne z obu stron przejścia*)

Wartość całkowita zadania: **149.060,76 zł. brutto** w tym: wykonawstwo – 145.860,76 zł. , nadzór inwestorski – 3.209,00 zł , promocja – tablica 400,00zł. .

Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

- budżet państwa RFRD - 80.502,00 zł. ( 57 % kosztów kwalifikowanych 140.996,15 zł)
- Powiat Limanowski - 34.074,76 zł. ( 50% kosztów własnych )
- Gmina Laskowa - 34.484,00 zł. ( 50% kosztów własnych )



W ramach lipcowego br. naboru wniosków o dofinansowanie z RFRD na rok 2024 - Powiat Limanowski uzyskał 50% dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację trzech kolejnych zadań drogowych w roku 2024.tj.

Zadanie nr 1:

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 1613 K Zamieście - Słopnice - Zalesie w km od 0+453,45 do km 0+956,63 w miejscowości Słopnice, Powiat Limanowski ”/** dług. 503 mb/

Zakres obejmuje: wykonanie chodnika wraz z poszerzeniem jezdni , przejściem dla pieszych oraz przebudową istniejącego oświetlenia ulicznego na odcinku ( *od granicy z m. Zamieście gm. Tymbark do istniejących zatok autobusowych – kontynuacja istniejących chodników*).

Szacunkowa wartość zadania : **2.551.710,91 zł. brutto** wg. kosztorysu inwestorskiego

Uzyskane 50% dofinansowanie z RFRD- 1.274.322,00 zł.( promesa )

Szacunkowy 50% udział Powiatu jak i Gminy po 638 695,00zł.

Partnerem zadania będzie Gmina Słopnice w 50% udziałem w kosztach własnych zadania.

Zadanie nr 2:

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 1610 K Świdnik – Limanowa w km od 4+006,00 do km 5+498,00 w miejscowości Łukowica , Powiat Limanowski ”** [ dł. 1492 mb ]

Zakres obejmuje: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z poszerzeniem jezdni do 6,0 mb , utwardzeniem pobocza , remontem istniejącego chodnika ok. 380 mb

Wartość szacunkowa zadania : **3.500.177, 18 zł. brutto** wg. kosztorysu inwestorskiego

Uzyskane 50% dofinansowanie z RFRD- 1.740.709,00 zł.( promesa )

Partner zadania Gmina Łukowica - szacunkowy udział finansowy 113 400,00 zł. , udział Powiatu na poziomie - 1 646 067,34 zł.

Zadanie nr 3:

**" Przebudowa drogi powiatowej nr 1617 K Piekielko - Tymbark na odcinku I - w km od 0+500,50 do km 1+110,25 na odcinku II w km od 1+185,25 do km 1+520,05 w miejscowości Piekielko/ Tymbark, Powiat Limanowski - Etap I w km od 0+500,50 do km 1+110,25"**

Zakres I etapu tj. w km 0+500,50 do km 1+110,25 ( *od zjazdu Szkoły Podstawowej do mostu w kierunku Tymbarku strona lewa dł. 609,75 mb* ) obejmuje wykonanie ścieżki rowerowo-pieszej , wraz z poszerzeniem jezdni i wykonaniem odcinkowo nowej nawierzchni jezdni , wraz z modernizacją przejścia dla pieszych i oznakowaniem drogowym.

Koszt szacunkowy zadania etap I - **3 396 948,40 zł. brutto.**

Uzyskane 50% dofinansowanie z RFRD- 1.681.948,00 zł.( promesa )

Partner zadania Gmina Tymbark - szacunkowy 50% udział finansowy 857 500,00 zł. , udział Powiatu na poziomie - 857 500,28 zł.

## Ugoda sądowa – zawarta w roku 2023

### Zadanie:

**„Przebudowy drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna – Podłopień: odcinek I w km od 0+075 do km 2+678 w miejscowości Łostówka ; odcinek II w km od 5+085 do km 9+120 w miejscowości Łostówka i Wilczyce – Powiat Limanowski”**

zadanie zrealizowano w ramach dofinansowania z RFRD ( były FDS ) w systemie trzyletnim 2020/2022.

Wartość zadania : **14.293.050,00 zł** w tym: ( *wykonawstwo 14.250.000,00 zł* ). Zadanie zakończono – wrzesień 2022r.

Wykonawca zadania : W.P.P.U.H. „JANDA” z Łostówki.

W związku z zaistniałym w I kw. 2022r. konflikcie zbrojnym na Ukrainie nastąpiły nadzwyczajne zmiany gospodarcze powodujące drastyczny wzrost cen materiałów i usług oraz inflacji, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania kontraktu. Mając na uwadze zrealizowane roboty w zakresie przewidzianym w roku 2022 , zgodnie z stosownymi zapisami ustawy Prawo Zamówieniach Publicznych art. 455 ust.1.pkt 4 na wniosek Wykonawcy w drodze postępowania sądowej doszło w dniu 14.02.2023r. do zawarcia ugody sądowej przed Sądem Rejonowym V Wydział Gospodarczy w Nowym Sączu dot. zwiększenia wypłaconego wynagrodzenia umownego za wykonane zadanie o kwotę wynagrodzenia dodatkowego w wysokości **640.000,00 zł.**

### **OSŁONA PRZECIWO SUWISKOWA - OSUWISKA**

W ramach planowanej akredytacji Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków co do możliwości pozyskania dofinansowania w formie dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 80% planowanych kosztów – Powiat uzyskał od Komisji Wojewody pozytywną akceptację opracowanej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej ( *wydatek roku 2022-143.910,00 zł brutto* ) a tym samym zgodę na ubieganie się o dofinansowanie ze środków budżetu państwa na opracowanie dokumentacji projektowej – wykonawczej zabezpieczenia i stabilizacji osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1632K w centrum Tymbarku w ramach zadania pn:

**„Stabilizacja osuwiska nr 8358 wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1632 K Kępanów – Tymbark w km 19+290 – 19+320 w m. Tymbark”** –( *centrum Tymbarku rejon od mostu na rz. Łososina do rynku* )

Szacunkowy koszt opracowania dokumentacji wykonawczej stabilizacji osuwiska - ok. 200 000,00 zł., w tym symulacja :

- 80% udział budżetu państwa - 160.000,00 zł.
- 20% udział Powiatu i Gminy Tymbark - 40.000,00 zł.

Planowane wykonanie PT - rok 2024 wraz z jednoczesnym ubieganiem się o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych.

## Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych

### wykonanie rok 2023

Na realizację zadań drogowych z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych Powiat Limanowski otrzymał w roku 2022 trzy *promesy wstępne* o łącznym dofinansowaniu sięgającym kwoty **21 mln zł.**, które w ramach zrealizowanych w roku 2023 poniższych zadań zostały wykorzystane w wysokości : **20.871.360,00 zł.**

1. W ramach II edycji programu POLSKI ŁAD na realizację poprawy infrastruktury drogowej pn: „**Modernizacja dróg i infrastruktury towarzyszącej na terenie Powiatu Limanowskiego**” Powiat Limanowski uzyskał dofinansowanie w wysokości: **15.200.000,00 zł.** stanowiącej 95% dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego do w/w zadania które ogółem wyniosło 16.255.601,67 zł.

W ramach modernizacji w roku 2023 wykonywane zostały odcinkowe remonty dróg powiatowych o łącznej długości ok. 12,3 km, w tym związane z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej na dł. 9,6 km.

Zakres w/w przedsięwzięcia obejmował 4-y zadania wg. charakterystyki jak podano poniżej tj.

#### Zadanie nr 1

- 1) „Remont drogi powiatowej nr 1579K Siekierzyna - Naszacowice w km od 0+020 do 2+438 w m. Kanina i Przyszowa” (*począwszy od DK 28 do mosty w „Berdychowcie” - dł. 2,4 km*) [ koszt 3 224 062,10 zł.]
- 2) „Remont drogi powiatowej nr 1545K Podegrodzie - Mokra Wieś - Jastrzębie od km 6+106 - 7+000 w miejscowości Stronie” (*pogranicze z Powiatem Nowosądeckim w kierunku Mokrej Wsi, dł. 0,9km*) [ koszt 875 567,85 zł.]
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1610K Świdnik - Limanowa w m. Łukowica w km 4+388,80 - 5+498” (*wykonanie pobocza utwardzonego kostką brukową w m. Łukowica ( od istniejącego chodnika w kierunku Roztoki- dł. 1,1 km)*) [ koszt 1 100 370,05 zł.]

Zadania w wyniku uzyskanych oszczędności z Polskiego Ładu – roboty dodatkowe .

- 4) „Remont drogi powiatowej nr 1545K Podegrodzie - Mokra Wieś - Jastrzębie od km 6+106 - 7+000 w miejscowości Stronie” - odwodnienie [ koszt 176 281,24 zł.]
- 5) Remont nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 1617K Piekiełko-Tymbark odc. I w km 2+630 – 2+882 w m. Tymbark (*strona prawa poszerzenie*) [ koszt 61 685,99 zł.]
- 6) Remont nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 1617K Piekiełko-Tymbark odc.II w km 2+896 – 3+757 w m. Tymbark (*strona prawa poszerzenie*) [ koszt 182 825,34 zł.]

Wartość wykonawcza zadania : **5 620 972,57 zł. brutto** , w tym 95% udział Polski Ład - 5 339 923,94 zł.

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LIMDROG Sp. z o.o. z Limanowej



Przyszowa



Stronie



Łukowica

## **Zadanie nr 2**

- 1) „Remont drogi powiatowej nr 1618K Limanowa - Szyk - Mstów od km 1+979 do km 3+353 w m. Koszary” (od wodociągów do granicy z m. Piekielko – dł. 1,4 km ) (koszt 2 235 777,17 zł.)
- 2) „Remont drogi powiatowej nr 1632K Kępanów - Tymbark w km 17+470 - 18+130 w m. Podłopień i Tymbark” ( od Podłopienia do skrzyżowania w kierunku Piekielka – dł. 0,7 km) (koszt 1 049 236,08zł)

3) „Remont drogi powiatowej nr 1622K Dąbie - Szczyrzyc - Dobra w km 15+072- 15+537 w m. Porąbka”(od przystanku BUS powyżej torów kolejowych w kierunku Skrzydlnej-dł. 0,5 km ) [ koszt 973 163,16 zł.]

4) „Remont drogi powiatowej nr 1622K Dąbie - Szczyrzyc - Dobra w km 18+524-18+786 w m. Dobra” ( od DK 28 do mostu – dł. 0,3 km ) [ koszt 581 083,07 zł.]

Zadania w wyniku uzyskanych oszczędności z Polski Ład – roboty dodatkowe.

5) „Remont drogi powiatowej nr 1609K Limanowa- Kamienica w km od 18+780 do km 20+212 w m. Kamienica i Zbludza” ( odc. nawierzchni 0,5 km + poszerzenie 0,5 km) (koszt 668 775,51 zł.)

Wartość wykonawcza zadania : : **5 508 034,99 zł. brutto**, w tym 95% udział Polski Ład - 5 232 633,24 zł.

Wykonawca: Firma ZBD Group Sp. z o.o. z Nowego Sącza



Koszary



Tymbark



Porąbka



Dobra

### **Zadanie nr 3**

- 1) „Remont drogi powiatowej nr 1609K Limanowa - Kamienica od km 16+060 do km 17+494 w m. Zalesie i Zbludza” ( *na pograniczu miejscowości dł. 1,4 km* ) [koszt 1 499 383,53 zł.]
- 2) „Remont drogi powiatowej nr 1629K Mszana Dolna - Hucisko w km 7+968 - 8+476 w m. Poręba Wielka” ( *w kierunku Koninek od mostu do wysokości Kościoła – dł. 0,5 km* ) [ koszt 783 362,67 zł]
- 3) „Remont drogi powiatowej nr 1629K Mszana Dolna - Hucisko w km 4+520 5+254 w m. Niedźwiedź” ( *od oś. Spyrki do Szkoły Podstawowej – dł. 0,734 km* ) [ koszt 1 095 576,38 zł]

Zadania w wyniku uzyskanych oszczędności z Polski Ład – roboty dodatkowe .

- 4) „Remont drogi powiatowej nr 1629K Mszana Dolna -Hucisko w km 8+418 – do km 8+520 w miejscowości Poręba Wielka ( *krawężnik plac parkingowy k/Kościola* ) [koszt 56 561,00 zł]
- 5) „Remont drogi powiatowej nr 1622K Dąbie-Szczyrzyc-Dobra w km 6+951 -7+371 w miejscowości Szczyrzyc centrum ( *nawierzchnia dł. 0,42 km* ) [ koszt 386 991,46 zł.]

Wartość wykonawcza zadania: **3 821 875,04 zł. brutto**, w tym 95% udział Polski Ład - 3 630 781,29 zł.

Wykonawca: Firma: ZIBUD Sp. z o.o. Spółka komandytowa z Kamienicy.





Zbludza



Poręba Wielka



Niedźwiedź





Szczyrzyc

#### **Zadanie nr 4**

„Zagospodarowanie turystyczne szlaku łączącego Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Zalesiu z parkingiem przy trasach w kierunku góry Mogielica poprzez wykonanie oświetlenia oraz infrastruktury turystycznej” [ koszt 993 933,14 zł.] + roboty dodatkowe: utwardzenie ścieżek i placów dodatkowe punkty turystyczne [ koszt 148 445,92 zł ]

Wartość wykonawcza zadania : **1 142 379,06 zł brutto** , w tym 95% udział Polski Ład – 1 085 259,62 zł.

Wykonawca: F.U.H. „MAXI” Jędrzejek Bogdan z Koszar

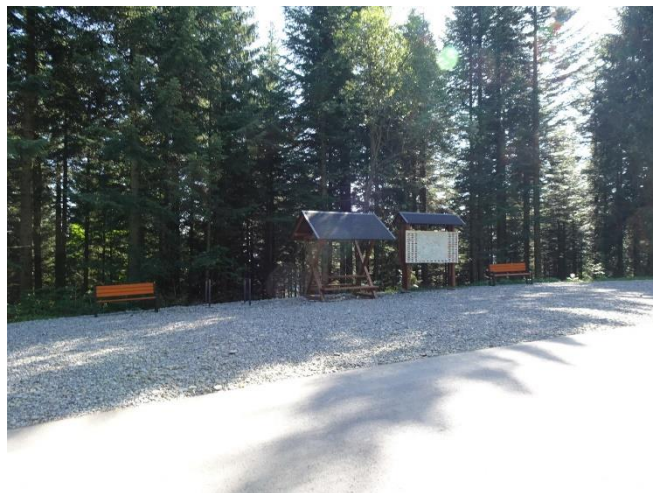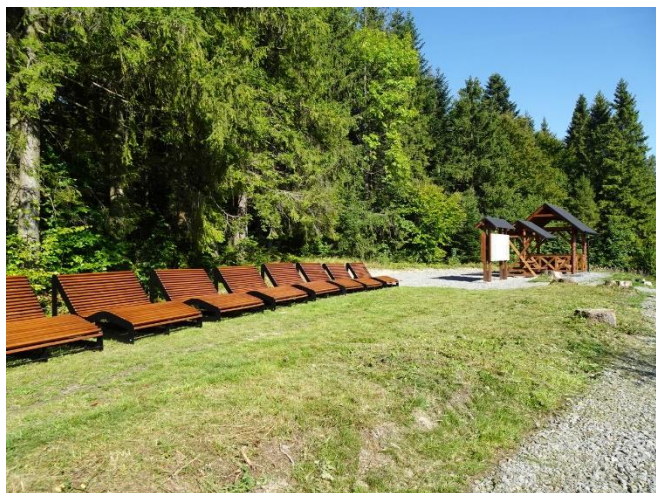

=====

### ***POLSKI ŁAD - teren popeegetowski***

Powiat Limanowski w wyniku otrzymanych dwóch promes o 98% dofinansowaniu z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach III naboru do programu POLSKI ŁAD - *tereny popeegetowskie* obejmujące obszar: Gminy Mszana Dolna, Gminy Jodłownik w roku 2023 zrealizował następujące zadania:

#### **Zadanie nr 1.**

**„Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych w miejscowości Kasina Wielka i Glisne na terenie Gminy Mszana Dolna” -**

Dofinansowanie 98% BGK w wysokości **1.862.000,00 zł.**

W ramach w/w zadania wykonana została odcinkowa przebudowa drogi powiatowej nr 1626K Kasinka Mała -Węglówka-Kasina Wielka obejmująca w swym zakresie przebudowę dwóch przepustów okularowych na skrzynkowe tzw . *ramowe* w miejscowości Kasina Wielka- rejon oś. *Paluszki* tj. w km 7+724 i w km 7+792 , oraz remont istniejącego przepustu w ciągu drogi powiatowej 1625K Tenczyn-Mszana Dolna w km 5+714 w miejscowości Glisne (*poniżej zjazdu do Kościoła*)

Wartość zadania po przetargu: **2.089.000,00 zł.** ( w tym wykonawstwo 2.069.838,36 zł. )

Mając na uwadze uzyskane dofinansowanie z Polskiego Ładu do kosztów wykonawczych - finansowanie przedmiotowego zadania w roku 2023 przedstawia się następująco:

- środki Polski Ład - 1.862.887,36,00 zł. ( udział 89% )
- środki własne Powiatu - 227 887,36 zł. ( udział 11% )

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo-Inżynieryjne BUDMOST Rafał Jędrzejek z Laskowej



Kasina Wielka



Glisne

## **Zadanie nr 2**

### **„Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Jodłownik”**

Wykorzystane dofinansowanie 98% BGK w wysokości **3.809 260,00 zł.**

Zakres zadania stanowiącego dofinansowanie obejmował :

1/ „Przebudowę drogi powiatowej nr 1632K Kępanów-Tymbark w km 3+743,40 – 4+423,65 w miejscowości Krasne Lasocice” ( *wykonanie chodnika i nowej nawierzchni bitumicznej dł. 680 mb* ) [ koszt 1 899 294,96zł.]

2/ „Remont drogi powiatowej nr 1621K Jodłownik -Szczyrzyc w km 0+185 – 1+040 oraz w km 1+498 – 3+413 w miejscowości Jodłownik , Janowice, Szczyrzyc” ( *wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej dł. 855mb, oraz wzmocnienie pobocza drogi kruszywem wraz z powierzchniowym utwaleniem emulsją* dł. 1912 mb ) [ koszt 1 480 705,05zł ]

Zadania w wyniku uzyskanych oszczędności z Polskiego Ładu– roboty dodatkowe .

3) „Remont drogi powiatowej nr 1622K Dąbie-Szczyrzyc-Dobra w km 5+974- 6+709 i km 7+371 – 7+473 w miejscowości Szczyrzyc ( *nawierzchnia* dł. 0.8 km ) [ koszt 507 062,79zł.]

Ponadto wykonano w ramach zadania nr 1 ( odrębnie ) zadanie :

4/ „Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi powiatowej nr 1632K Kępanów-Tymbark w km 3+943 do km 4+093 w miejscowości Krasne Lasocice” - 100% finansowanie Gminy Jodłownik [ koszt 272 000,00zł.]

Wartość wykonawcza zadania przy udziale Polski Ład : **3 887 062,79 zł. brutto**, w tym 98% udział Polski Ład - 3 809 260,00 zł. [ zad. Nr 1,2,3 ]

**Wartość całkowita zadania: 4 191 275,28 zł. brutto**

Udział finansowy Gminy Jodłownik w realizacji zadania nr 1 ( *chodnik* ) oraz nr 4 wynosi – 289 550,00 zł. ( w tym kanalizacja sanitarna – 272.000,00 zł )

Wykonawca: W.P.P.U.H. JANDA z Łostówki. s



Krasne Lasocice



Jodłownik

= = = = =

### **Inicjatywy samorządowe z Gminami [ IS ]**

Ważnym aspektem współpracy Powiatu z samorządami lokalnymi w zakresie poprawy warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na drogach powiatowych jest wzajemne podejmowanie działań w ramach inicjatyw samorządowych obejmujących opracowanie dokumentacji projektowych wykonania chodników, utwardzenia bitumicznie poboczy dróg, czy wykonania dodatkowych miejsc komunikacji publicznej oraz następnie ich wykonawstwo zgodnie z oczekiwaniami lokalnych społeczności.

**Gmina Łukowica;** (kontynuacja zadanie 2022/2023)

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 1545K Podegrodzie-Mokra Wieś-Stronie -Jastrzębie w km 10+860,00 do 11+488,20 w miejscowości Łukowica” - tzw. Czartowska** - wykonano chodnik oraz pobocze utwardzone kostką brukową wraz z odwodnieniem. Zadanie w systemie dwuletnim 2022/2023.

Realizacja zadania w ramach inicjatyw samorządowych w relacji 50/50.

Wartość całkowita zadania : **3.434.865,90 zł. brutto** ( wykonawstwo – 3.370.000,00zł., dokumentacja projektowa – 64.865,90 zł. ) przy czym:

1/ udział finansowy Powiatu Limanowskiego - 1.685 000,00 zł. brutto ( rok 2023 )

2/ udział finansowy Gminy Łukowica - 1.717.433,90 zł. brutto

Inwestor: Gmina Łukowica .

Wykonawca zadania: P.P.U.H. JANDA z Łostówki.



---

---

**Regulacja prawna nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe ze stanem na 01.01.1999 r. – roboty w toku .**

**„Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych wraz ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjno-prawnej dla celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy w latach 2021-2023” (kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2021 )**

1) Zadanie częściowe nr 1 - Regulacja stanu prawnego odcinków dróg powiatowych nr 1579K, 1613K i 1618K (umowa nr U/3/2021 z dnia 20.07.2021 r.)

2) Zadanie częściowe nr 2 - Regulacja stanu prawnego odcinków dróg powiatowych nr 1609K, 1614K, 1620K, 1625K, 1626K i 1555K (umowa nr U/4/2021 z dnia 20.07.2021 r.)

3) Zadanie częściowe nr 3 - Regulacja stanu prawnego odcinków dróg powiatowych nr 1616K, 1628K i 1629K (umowa nr U/5/2021 z dnia 20.07.2021 r.)

Planowane wydatki w latach 2021-2023 – 700.000,00 zł

Poniesiony wydatek finansowy w ramach planu finansowego PZD na rok 2023 - WPF–  
**272.000,00 zł**

**Wykonawcy:**

1) GEO-ART Geodezja i Budownictwo z Czarnego Dunajca, reprezentowane przez Geodetę uprawnionego Justynę Polaczek (zadanie częściowe nr 1 i 3)

2) Marcin Kolasa „GEOPROJEKT” Zakład Usług Geodezyjno-Kartograficznych z Krakowa (zadanie częściowe nr 2)

*Wykonanie w/w zadań w roku 2023 będzie skutkowało uregulowaniem stanu prawnego własności 67% powierzchni gruntowej dróg powiatowych ( 161,84 ha ). Pozostało do regulacji 33% ( 128,4 ha ) . [ ogółem powierzchnia gruntowa dróg - 390,2 ha ]*

---

---

## I N N E - dokumentacje projektowe

W ramach posiadanego zabezpieczenia finansowego w planie finansowym PZD na rok 2023 „*Dokumentacja projektowo-kosztorysowa inwestycji drogowych*” w kwocie 200.000,00 zł.

1. Wykonana została aktualizacja dokumentacji projektowej wykonania chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1613K Zamieście-Słopnice-Zalesie w m. Słopnice w ramach zadania pn: „**Przebudowa odcinkowa drogi powiatowej nr 1613K Zamieście-Słopnice-Zalesie w km 0+453,45 -1+077,80 poprzez wykonanie chodnika w m. Słopnice – strona prawa i lewa**”. Koszt aktualizacji dokumentacji projektowej - **47.355,00 zł. brutto** ,

Wykonawca - F.U.H. „RENOWA” Krzysztof Waniczek , Kluszkowce. Rozliczenie kosztów aktualizacji dokumentacji projektowej z Gminą Słopnice w relacji 50/50 w ramach IS nastąpi na etapie wykonawczym.

2. Wykonano dokumentację projektową przebudowy obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1630K Niedźwiedź -Konina w km 1+278 w miejscowości Niedźwiedź ( *rejon k/ piekarni* ) pn:

**„Przebudowa obiektu mostowego JN1 35000277 w km 1+284 w ciągu drogi powiatowej nr 1630K Niedźwiedź – Konina w miejscowości Niedźwiedź oraz w miejscowości Konina”**

Wartość opracowania dokumentacji : **58 671,00 zł brutto**

Wykonawca: F.U.H. „RENOWA” Krzysztof Waniczek , Kluszkowce

### Likwidacja przelomów i zapadnięć

1. „**Likwidacja przelomów w ciągu drogi powiatowej nr 1610K Świdnik-Limanowa w miejscowości Roztoka k/tartaku oraz w miejscowości Stara Wieś k/kamieniolomu**  
Koszt: **92.592,43 zł.**  
Wykonawca : PPUH JANDA z Łostówki
2. „**Likwidacja przelomu w ciągu drogi powiatowej nr 1580K Zalesie-Jadamwola-Olszana w miejscowości Młynczyńska**”  
koszt **82.875,74 zł.**  
Wykonawca : PPUH JANDA z Łostówki
3. **Likwidacja zapadnięć i przelomów w ciągu drogi powiatowej nr 1613K Zamieście - Słopnice- Zalesie w km od 6+745 do km 7+207 w miejscowości Słopnice „Górne”** ( *rejon oś. Skalnica – oś. Giemziki Dolne odcinek 462 mb* )  
Koszt : **57.026,48 zł. brutto.**  
Wykonawca P.D.M. LIMDROG Sp. z o.o z Limanowej

### Wymiana barier ochronnych

**„Wymiana barier ochronnych w ciągu drogi powiatowej nr 1614K Słopnice-Chyszówki-Jurków w miejscowości Słopnice rejon Szkoły Podstawowej”** likwidacja starych zdewastowanych barier ochronnych i montaż nowych barier ochronnych typu U-12 na odcinku 135 mb w ciągu drogi powiatowej nr 1614K Słopnice-Chyszówki-Jurków w miejscowości Słopnice

Koszt: **56.364,75 zł. brutto**

Wykonawca : Firma DROGBUD Stanisław Staśko Słopnice

### **Nowa nawierzchnia**

**„Przebudowa drogi nr 1545K Podegrodzie -Mokra Wieś-Jastrzębie w km 7+837 – 8+004 w miejscowości Stronie - wymiana nawierzchni jezdni”**

wykonano odcinkową wymianę nawierzchni drogi powiatowej nr 1545K Podegrodzie -Mokra Wieś-Jastrzębie w km 7+837 – 8+004 w miejscowości Stronie ( *odcinek 167 mb rejon Szkoła Podstawowa – Kaplica Parafialna* ) w ramach odrębnego zadania pn. „ **Przebudowa drogi nr 1545K Podegrodzie -Mokra Wieś-Jastrzębie w km 7+837 – 8+004 w m. Stronie - wymiana nawierzchni jezdni”**

Koszt : **65 002,00 zł. brutto**

Wykonawca : PDM LIMDROG Sp. z o.o. z Limanowej

### **Zabezpieczenia przepustów drogowych**

1. Wykonano zabezpieczenia przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1628K Poręba Wielka-Poręba Górna w Porębie Górnej ( oś. Liberdy)  
Koszt : **21.082,20 zł. brutto**
2. Wykonano zabezpieczenia przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1628K Poręba Wielka-Poręba Górna w Porębie Górnej ( oś. Bastówka)  
Koszt : **61.602,71 zł. brutto**
3. Wykonano zabezpieczenia przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1628K Poręba Wielka-Poręba Górna w Porębie Górnej ( oś. Misiury)  
Koszt : **47.736,30 zł. brutto**

Wykonawca w/w zadań: Firma WOD-MAR Mariusz Sołtys z Pisarzowej

---

---

### **DOKUMENTACJE PROJEKTOWE DROGOWE** **wykonywane przez samorzady lokalne ( chodnikowe )**

Mając na uwadze planowane ubieganie się dofinansowanie ze środków RFRD w kolejnych edycjach w ramach wspólnej inicjatywy z samorządami gminnymi w trakcie podjętych działań w toku opracowywania są dokumentacje projektowe obejmujące wykonanie chodników, poboczy utwardzonych przy drogach powiatowych.

1/ **z Gmina Niedźwiedź** ( *inwestor* )

- „Przebudowa drogi powiatowej 1630K Niedźwiedź – Konina w m. Konina od Kościoła (od istniejącego chodnika) do osiedla Hałamy”, - ( *1,6 km-opracowana* )
- „Przebudowa drogi powiatowej 1630K Niedźwiedź – Konina w m. Konina od oś. Michalczewscy do istniejącego chodnika na oś. Pazyrówka”, - ( *1,7 km opracowania* )

2/ z **Gminą Mszana Dolna** ( inwestor ):

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1627K Raba Niżna – Olszówka w km od 0+000 do km 4+647 w miejscowości Raba Niżna i Olszówka -Powiat Limanowski” ( w toku opracowania)
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1626K Kasinka Mała-Węglówka-Kasina Wielka w km od 6+876 do km 8+576 w miejscowości Kasina Wielka – wykonanie chodnika wraz z oświetleniem ulicznym” - ( w toku opracowania )

3/ z **Gminą Łukowica** ( inwestor )

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1610K Świdnik -Limanowa w km 4+388 - 5+498 w m. Łukowica” ( poszerzenie i wykonanie nawierzchni bitumicznej , utwardzenie pobocza kostką brukową , odwodnienie ) ( opracowana )
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580K Zalesie -Jadamwola -Olszana odcinek I w km od 1+520 do km 2+680 w miejscowości Młyńczyska , odcinek II w km od 7+050 do km 12+252 w miejscowości Młyńczyska, Jastrzębie i Jadamwola - Powiat Limanowski” - wykonanie chodników, pobocza bitumicznego, wymiana nawierzchnia jezdni wraz z poszerzeniem ( opracowana)
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1610K Świdnik -Limanowa w m. Łukowica/ Roztoka w km 5+498- 7+348 w m. Łukowica i Roztoka” (poszerzenie i wykonanie nawierzchni bitumicznej, utwardzenie pobocza, odwodnienie - od Łukowicy do Szkoły Podstawowej w Roztoce ) ( opracowana )
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580K Zalesie -Jadamwola -Olszana odcinek I w km od 1+520 do km 2+680 w miejscowości Młyńczyska , odcinek II w km od 3+100 do km 4+230 w miejscowości Młyńczyska” ( wykonanie chodnika wraz z poszerzeniem jezdni , odwodnieniem ) ( opracowana)

4/ z **Gminą Tymbark** [IS]

- „Przebudowy skrzyżowania drogi krajowej DK28 z drogą powiatową nr 1632K Kępanów - Tymbark oraz drogą gminną „Do Noku ” w formie czterowylotowego ronda” -w toku opracowania  
Wydatek poniesiony w roku 2023 – 80.000,00 zł. w relacji 50/50:
  - Powiat Limanowski – 40.000,00zł.
  - Gmina Tymbark - 40.000,00 zł.

Wykonawca : Biuro Projektowe F.U.H. RENOWA z Nowego Sącza

Opracowano warianty koncepcje zagospodarowania terenu oraz wybrano wariant rozwiązania i opracowano ostateczny plan zagospodarowania terenu [ PZT ] zadania wraz z uzyskaniem uzgodnień rozwiązania przez GDDKiA i samorządy : Gminy Tymbark i Powiat Limanowski .

*Dalsze działania związane z zakończeniem procesu przygotowawczego tj. opracowania dokumentacji wykonawczej, przebudowy kolidującego uzbrojenia podziemnego, dopełnienia niezbędnych uzgodnień branżowych i formalnych będą prowadzone w ramach wzajemnych ustaleń przez Gminę Tymbark jako inwestora w ramach odrębnego postępowania przetargowego.*

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 1618K Limanowa- Szyk-Mstów w miejscowości Piekielko** – ( rejon Koszary - skrzyżowanie z drogą gminną do Kisielówki )
- wykonanie chodnika i pobocza bitumicznego (opracowana) - inwestor Gmina



- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1617 K Piekielko - Tymbark na odcinku I - w km od 0+500,50 do km 1+110,25 na odcinku II w km od 1+185,25 do km 1+520,05 w miejscowości Piekielko / Tymbark - wykonanie ścieżki rowerowo-pieszkiej od Szkoły Podstawowej w Piekielku w kierunku Tymbarku ( 0,9 km ) – inwestor Gmina ( opracowana )

5/ z Gminą Laskowa ( inwestor )

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 1451K Wojakowa- Sechna- Ujanowice w miejscowości Sechna i Ujanowice** - wykonanie chodnika wraz z poszerzeniem jezdni ( *opracowana , Gmina Laskowa* )

## Z E S T A W I E N I E R Z E C Z O W O - F I N A N S O W E - r o k 2 0 2 3

### Wykonano:

- |   |            |
|---|------------|
| - nowa nawierzchnia bitumiczna              | - 17 km    |
| - budowa chodnika                           | - 6 km     |
| - utwardzone pobocza kostką brukową         | - 1,7 km   |
| - przebudowa przepustów drogowych na ramowe | - 3 sztuka |
| - modernizacja przejść dla pieszych         | - 8 sztuk  |

**WYDATKI** poniesione przez PZD na wykonanie zadań drogowych w roku 2023

- **58.844.749,77 zł.**

w tym wydatki inwestycyjno-remontowe zadań drogowych - **48.222.696,00 zł.**

**ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO ( wydatek)– OGÓŁEM:**

**36.891.055,78 zł.**

w tym:

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| - <b>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</b>   | - <b>11.970.235,00 zł.</b> |
| - <b>Polski Ład</b>                     | - <b>20.871.260,00 zł.</b> |
| - <b>Fundusz Leśny</b>                  | - <b>835.183,00 zł.</b>    |
| - <b>rezerwa ogólna budżetu państwa</b> | - <b>1.123.782,78 zł.</b>  |
| - <b>JST ( Gminy )</b>                  | - <b>2.090.595,00 zł.</b>  |

**Wydatek Powiatu – udział w realizacji zadania drogowego w ramach IS z Gminą Łukowica - 1.685.000,00 zł.**

Limanova dn. 29.01.2024 r.
